


K.O. PROYECTO GESTIÓN LICENCIAS



RESPONSABLES

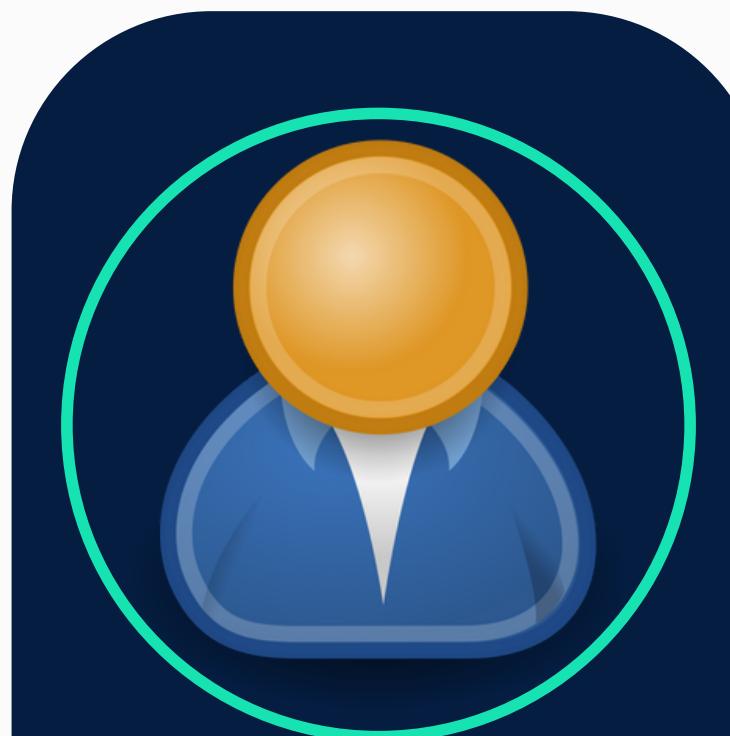


**RESPONSABLE
MCP**

Jorge Estrella
/ Alexander
Espinoza



**RESPONS
ABLE DEV**

Daniel Puicon

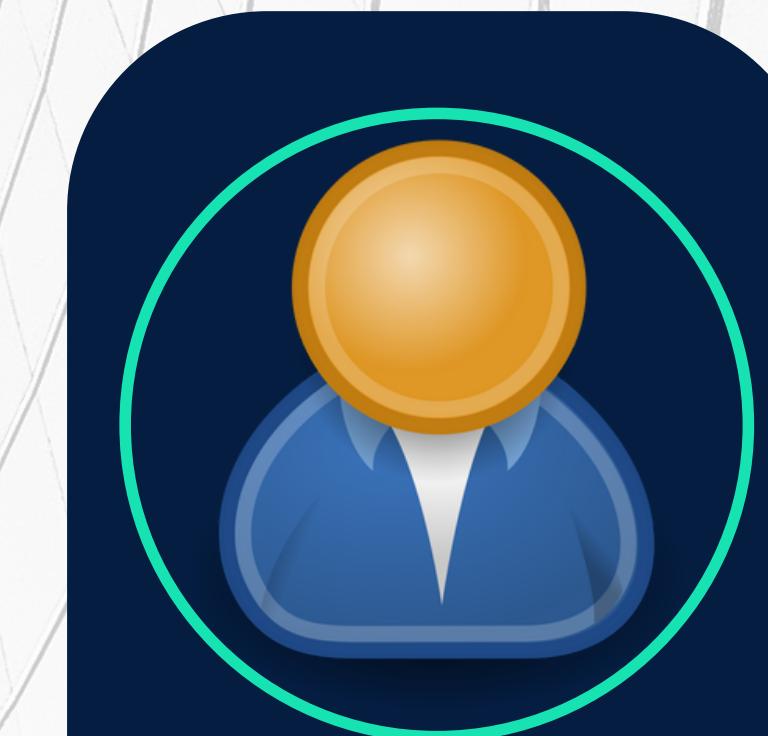

PM

Joseph Condor

INDICE

- RESUMEN DEL PROYECTO
- CRONOGRAMA DEL PROYECTO
- PENDIENTES



RESUMEN DEL PROYECTO

SITUACIÓN ACTUAL

- Se presentó demoras en la programación para entender la logica y estructura del código.
- Se esta empezando con el moduló de conformidades según las actividades.
- Se necesita una reunión con Julio o Pedro para explicar si existen apis para descargar y subir PDF

Desviación: 9%

DURACIÓN PROYECTO

F. INI: 06.01.2025 F.FIN: 21.02.2025
F. INI: 06.01.2025 F.FIN: 14.02.2025

AVANCE PLAN : 39%

AVANCE REAL : 30%

Presentaciones de avance:

27.01.2025 Presentación módulo Proveedores
03.02.2025 Presentación módulo Conformidades
10.02.2025 Módulo PDF
14.02.2025 Presentación de flujo del sistema

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DEL PROYECTO



Actividades de Desarrollo		Proyecto Gestión de licencias						
Nº	Desarrollo	Encargad	Fecha In	Fecha Fin	Replantear Fecha	Porcentaje Plan	Avance Re	Estado
1	preparar ambiente de producción	Daniel	06/01/2025	07/01/2025		100%	100%	Completado
2	Reunión para revisión de tablas y habilitación de lectura de las BD que se usarán	Daniel	08/01/2025	10/01/2025		100%	100%	Completado
3	Comparar tablas y crear tablas referentes hasta outsystem y DEV	Daniel	13/01/2025	17/01/2025		100%	100%	Completado
4	Presentación y Revisión de tablas finales y presentación de tareas	Daniel	20/01/2025	20/01/2025		100%	100%	Completado
5	MODULO PROVEEDORES					100%	100%	Completado
6	Procedimientos almacenados (listar)	Daniel	21/01/2025	21/01/2025		100%	100%	Completado
7	API: listar Proveedores	Daniel	22/01/2025	22/01/2025		100%	100%	Completado
9	Pantalla de listado con buscador	Daniel	22/01/2025	22/01/2025		100%	100%	Completado
11	Conexión con APIs	Daniel	23/01/2025	23/01/2025		100%	100%	Completado
12	Presentación del módulo Proveedores	Daniel / Joseph	24/01/2025	24/01/2025		100%	100%	Completado

13	MODULO CONFORMIDADES					100%	0%	En Proceso
14	Crear tabla de conformidades y relaciones	Daniel	24/01/2025	24/01/2025		100%	0%	En Proceso
15	Procedimientos almacenados (listar/insertar)	Daniel	24/01/2025	24/01/2025		100%	0%	En Proceso
16	API: para listar conformidad	Daniel	27/01/2025	27/01/2025		0%	0%	En Proceso
17	API: insertar conformidades	Daniel	27/01/2025	27/01/2025		0%	0%	En Proceso
18	Pantalla de registro de conformidades	Daniel	28/01/2025	28/01/2025		0%	0%	En Proceso
19	Pantalla de listado con acciones (editar/replicar)	Daniel	29/01/2025	29/01/2025		0%	0%	En Proceso
20	Conexión con APIs	Daniel	30/01/2025	30/01/2025		0%	0%	En Proceso
21	Presentación del módulo Conformidades	Daniel / Joseph	31/01/2025	31/01/2025		0%	0%	En Proceso

22	MODULO PDF					0%	0%	En Proceso
23	Preparar rutas de almacenamiento para PDFs	Daniel	03/02/2025	03/02/2025		0%	0%	En Proceso
24	API: para subir PDF	Daniel	03/02/2025	03/02/2025		0%	0%	En Proceso
25	API: para descargar PDF	Daniel	04/02/2025	04/02/2025		0%	0%	En Proceso
26	Implementar la lógica para cambiar los estados de PDF	Daniel	04/02/2025	04/02/2025		0%	0%	En Proceso
27	Pantalla de gestión de PDFs	Daniel	05/02/2025	05/02/2025		0%	0%	En Proceso
28	Integración con APIs de PDFs	Daniel	06/02/2025	06/02/2025		0%	0%	En Proceso
29	Presentación del módulo PDFs	Daniel / Joseph	07/02/2025	07/02/2025		0%	0%	En Proceso
30	MODULO CONSUMIR LIBRERIA LOGIN					0%	0%	En Proceso
31	Traspaso de consumo de la librería login	Xavier	10/02/2025	10/02/2025		0%	0%	En Proceso
32	Implementación de la librería login	Daniel	11/02/2025	11/02/2025		0%	0%	En Proceso
33	Integración librería con el sistema	Daniel	12/02/2025	12/02/2025		0%	0%	En Proceso
34	Presentación del flujo del sistema	Daniel	13/02/2025	13/02/2025		0%	0%	En Proceso

TAREAS PENDIENTES

- Reunión con Julio para definir las BD de los sistemas y Aplicativos
- Preguntar a Pedro sobre los APi para descargar y subir PDF





CHINALCO
